

Kęstutis Keliutis

Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažyma
2012 m. birželio 13 d. Nr. 117032/1977

DAUGIABUČIO NAMO, Sodų g. 4, Palanga,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

2019.11.25



Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliutis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Kęstutis Keliutis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas:

UAB "Palangos komunalinis ūkis", Vytauto g. 112, Palanga, 8 460 48 705, administracija@palanga.lt
(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas:

UAB "Palangos komunalinis ūkis", Vytauto g. 112, Palanga, 8 460 48 705, administracija@palanga.lt
(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra:

_____ (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio namo adresu: Sodų g. 4, Palanga, atnaujinimo (modernizavimo) darbų investicijų planas vykdomas pagal Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. CPO129641 pasirašytą 2019.10.07 Prie investicijų plano pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-03537. Pastato energinio naudingumo klasė - F. Vizualinės apžiūros aktas Nr. 191009-2; Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Investicijų plane siūlomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių paketai A ir B. Įgyvendinus projektą pagal paketą B, būtų pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis.

Investicinis planas parengtas vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 14 d. Nr. D1-488 ĮSAKYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMU. Kainų parinkimui panaudotos UAB "Sistela" rekomendacijos, o taip pat remtasi rinkos kainomis ir įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO LT svetainėje.

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

Kasmetinė	Nr. -;	-
Eskiziniai planai	Nr. 191009-1;	2019.10.09
Vizualinė	Nr. 191009-2;	2019.10.09
NML	Nr. 191009-3;	2019.10.09

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1.1 Namų konstrukcija (pagal sienų medžiagas)	Plytų mūras
1.2 Aukštų skaičius	4
1.3 Statybos metai	1986
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.	-
1.4 Namų energinio naudingumo klasė	F
1.4.1 Sertifikato nr.	KG-0212-03537
1.4.2 Sertifikato išdavimo data	2019.12.18
1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate	1646,88 m ²
1.4.4 Energijos sąnaudos pastato šildymui nurodytos sertifikate	181,8 kWh/m ² /metus
1.4.5 Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis	centrinis šildymas
1.5 Užstatytas plotas	589 m ²
1.6 Priskirto žemės sklypo plotas	m ²
1.7 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)	2964,203 tūkst. Eur

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1	Bendrieji rodikliai			
2.1.1	butų skaičius	vnt.	51	
2.1.2	butų naudingasis plotas	m ²	1532,23	
2.1.3	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	

2.1.4	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingasis) plotas	m ²	0	
2.1.5	namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)	m ²	1532,23	
2.2	Sienos (nurodyti konstrukciją)			
2.2.1	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	1774,00	Plytų mūras
2.2.2	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,27	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.2.3	cokolio plotas	m ²	227,00	Antžeminė dalis: 67,00
				Požeminė dalis: 160,00
2.2.4	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,46	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.3	Stogas (nurodyti konstrukciją)			
2.3.1	stogo plotas	m ²	682,00	Sutapdintas
2.3.2	stogo šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,85	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.4	Langai ir balkonų durys			
2.4.1	langų skaičius, iš jų:	vnt.	92	
2.4.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	88	
2.4.2	langų plotas, iš jų:	m ²	211,81	
2.4.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	203,41	
2.4.3	balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	vnt	16	
2.4.3.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt	14	
2.4.4	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	25,76	
2.4.4.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	22,54	
2.5	Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:			
2.5.1	langų skaičius, iš jų	vnt	9	
2.5.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt	3	
2.5.2	langų plotas, iš jų:	m ²	42,85	
2.5.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	19,79	
2.5.3	lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius	vnt	9	keičiamos durys: įėjimo - 2 vnt., rūsio - 2 vnt., tambūro - 2 vnt.
2.5.4	lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas	m ²	29,39	keičiamos durys 24,56 m ²
2.6	Rūsiai			
2.6.1	rūsio perdangos plotas	m ²	460	
2.6.2	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamoji daiktas.

3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas *	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
3.1	išorinės sienos	3	Sienų konstrukcija - plytų mūras, sienos tinkuotos. Konstrukcija nešiltinta, neapsaugota nuo tiesioginių atmosferos kritulių, sienų šiluminė varža netenkina norminių reikalavimų.	Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.191009-2. 2019.10.09 Apžiūros vadovas Kęstutis Keliuotis, kvalif. atestatas Nr.0212, išd. 2013.08.27., Nr.11610, išd. 2007 10 26.
3.2	pamatai	3	Pamatai betoniniai, neapšiltinti, ties nuogrinda sudrėkę.	
3.3	nuogrinda	3	Nuogrinda išsikraipiusi, įrengta ne visu perimetru aplink pastatą, apaugusi žole.	
3.4	stogas	3	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Ant stogo telkšo balos, vanduo nenubėga. Konstrukcija nešiltinta, patiriami didžiuliai šilumos nuostoliai.	
3.5	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	3	Beveik visi butų langai ir balkonų durys pakeisti PVC profilio. Likę seni, mediniai, patiriami dideli šilumos nuostoliai.	
3.6	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Būklė patenkinama, vietomis tinkas aprupėjęs.	
3.7	rūsio perdanga	3	Rūsysis nešildomas, perdanga neapšiltinta.	
3.8	bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	3	Vienos laiptinės langai seni, mediniai, kitos - pakeisti PVC profilio. Rūsio langai seni. Įėjimo durys metalinės, su kodine spyna. Rūsio durys pakeistos. Abiejose laiptinėsi tambūro durų nėra, jos išimtos.	
3.9	šildymo sistema	3	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas neatnaujintas, pastatas šildomas netolygiai.	
3.10	karšto vandens sistema	3	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti.	

3.11	vandentiekis	3	Vandentiekio vamzdynai seni.	Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.191009-2. 2019.10.09 Apžiūros vadovas Kęstutis Keliuotis, kvalif. atestatas Nr.0212, išd. 2013.08.27., Nr.11610, išd. 2007 10 26.
3.12	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	3	Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs pralaidumas.	
3.13	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.	
3.14	bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	3	Elektros instaliacija nepakeista, būklė patenkinama.	
3.15	bendrojo naudojimo laiptinės	3	Laiptinių sienos išdažytos, dažai išblukę, laiptai ir turėklų porankiai neatnaujinti.	

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2016 - 2018 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.

3 lentelė

Eilės nr.	Rodiklis	Matas	Kiekis
1	2	3	4
4.1.1	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	KWh/metus	278559
		KWh/m ² /metus	181,8
4.1.2	Namų energinio naudingumo klasė	klasė	F
4.1.3	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.	kWh/metus	205 269,33
		kWh/m ² /metus	133,97
4.1.4	4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3 629,00
4.1.5	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.	kWh/dienolaipsniui	56,56

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namų esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:	67,27	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato langus:	30,71	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato stogą:	25,4	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių:	15,21	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tiltelius:	19,62	kWh/m ² /metus
Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:	1,09	kWh/m ² /metus

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Priemonių paketas A

4.1 lentelė

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai		Darbų kiekis (m ² , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m ² K) ir (ar) kiti rodikliai			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.1.	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas					
5.1.1.	<p>Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiamas cirkuliacinis siurblys, šildymo sistemos stovuose pakeičiama uždaroji armatūra. Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.</p> <p style="text-align: right;">punkto modernizavimas 1 vnt cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt uždaroji armatūra stovams ir magistralėms 25 m</p>			1 kompl.	7 768,59	7 768,59
5.1.2.	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)					
	<p>Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Atnaujinami šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakeičiami šildymo sistemos stovai. Vamzdžių tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovų montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali šilumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p> <p style="text-align: right;">Balansiniai ventiliai 27 vnt Magistraliniai vamzdynai 293 m</p>			1 kompl.	49 384,13	49 384,13

		Stovai 633 m Radiatoriai 102 vnt Termostatiniai ventiliai 102 vnt Dalikliai 102 vnt				
5.1.3	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas Modernizuojama karšto vandens ruošimo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai, papildomai įrengiamas karšto vandens recirkuliacinis kontūras, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai. Karšto vandens ruošimui – dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. Įrengiami nauji rankšluosčių džiovintuvai.	Termostatiniai ventiliai 12 vnt Magistraliniai vamzdynai 147 m Stovai 480 m Gyvataukai 51 vnt		1 kompl.	28 269,33	28 269,33
5.1.4	natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo grotelės. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.			51 butas	4 511,46	88,46
5.1.5	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami ir šiltinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: ant jau esamos stogo dangos įrengiama nauja danga, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Stovai ~ 29 m., išvadai ~ 31,50 m., vamzdynai ~ 165 m. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.		$U \leq 0,16$ (W/m ² K)	682,00 m ²	49 472,28	72,54
5.1.6	išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą					

	Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos polistireniniais putplasčiais. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,20$ (W/m ² K). Balkono laikančių konstrukcijų ir saugos aptvarų keitimas. Balkonuose esančių išorės sienų šiltinimo tipą ir būdą numatyti techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.	$U < 0,20$ (W/m ² K)	1774,00 m ²	147 632,28	83,22
5.1.7	cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Techniniame projekte numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. Antžeminė dalis 67 m ² Požeminė dalis 160 m ²	$U < 0,25$ (W/m ² K)	227,00 m ²	16 614,23	73,19
5.1.8	nuogrindos sutvarkymas Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		133,04 m ²	5 095,43	38,30
5.1.9	balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą				

	Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius viršutiniuose aukštuose. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viršaus. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		118,00 m ²	14 911,66	126,37
5.1.10	bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus) Pakeisti rūsio ir laiptinės langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Laiptinės langai 3 vnt Rūsio langai 3 vnt	U ≤ 1,3 (W/m ² K)	23,06 m ²	4 549,48	197,29
5.1.11	bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus) Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Įėjimo durys 2 vnt Rūsio durys 2 vnt Tambūro durys 2 vnt	U ≤ 1,4 (W/m ² K)	24,56 m ²	6 684,62	272,18
5.1.12	įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Pandusas 2 vnt	-	5 m ²	574,95	114,99
5.1.13	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Butų langai 8,4 m ² Balkonų durys 3,22 m ²	U ≤ 1,3 (W/m ² K)	11,62 m ²	1 831,55	157,62
5.1.14	rūsio perdangos šiltinimas Rūsio perdangą šiltinti apklįjuojant termoizoliaciniu sluoksniu rūsio lubas ir nudažyti.		459,5 m ²	8 721,31	18,98
5.1.15	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)				

	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos. Investicijos skaičiuojamos butų skaičiui 51 vnt		1 kompl.	12 031,03	12 031,03
	Iš viso (Eur be PVM)			360 548,20	
	PVM			75 715,12	
	Iš viso (Eur su PVM)			436 263,32	
5.2	kitos priemonės				
5.2.1	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas				
	Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždarojami armatūra, nauji stovai ir atsakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas. Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 285 m Stovai 139 m		1 kompl.	10 707,45	10707,45
5.2.2	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas				
	Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Buitinių nuotekų stovai 236 m Buitinių nuotekų magistralinis vamzdynas 248 m Išvadai 12 m		1 kompl.	8 501,44	8 501,44
5.2.3	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas				
	Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastasis remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą. Laiptinių sienų plotas 221 m2 Lubų plotas 107 m2 Laiptų plotas 80 m2 Turėklų plotas 21 m2		2 laiptinės	3 455,50	3 455,50
	Iš viso (Eur be PVM)			22 664,39	
	PVM			4 759,52	
	Iš viso (Eur su PVM)			27 423,91	
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais			5,91	

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai			Darbų kiekis (m ² , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m ² K) ir (ar) kiti rodikliai				
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.	energijos efektyvumą didinančios priemonės						
5.1.1.	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas						
5.1.1.	<p>Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiamas cirkuliacinis siurblys, šildymo sistemos stovuose pakeičiama uždaroji armatūra. Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.</p> <p style="text-align: right;">punkto modernizavimas 1 vnt cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt uždaroji armatūra stovams ir magistralėms 25 vnt</p>			1 kompl.	7 768,59	7 768,59	
5.1.2	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)						
	<p>Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Atnaujinami šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakeičiami šildymo sistemos stovai. Vamzdžių tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovų montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali šilumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p> <p style="text-align: right;">Balansiniai ventiliai 27 vnt Magistraliniai vamzdynai 293 m Stovai 633 m</p>			1 kompl.	49 384,13	49 384,13	

		Radiatoriai 102 vnt Termostatiniai ventiliai 102 vnt Dalikliai 102 vnt				
5.1.3	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas Modernizuojama karšto vandens ruošimo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai, papildomai įrengiamas karšto vandens recirkuliacinis kontūras, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai. Karšto vandens ruošimui – dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. Įrengiami nauji rankšluosčių džiovintuvai.	Termostatiniai ventiliai 12 vnt Magistraliniai vamzdynai 147 m Stovai 480 m Gyvatukai 51 vnt	1 kompl.	28 269,33	28 269,33	
5.1.4	natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo grotelės. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		51 butas	4 511,46	88,46	
5.1.5	individualių rekuperatorių įrengimas Įrengti minirekuperatorius kiekvienam butui po 1 vnt.		51 vnt.	31 190,07	611,57	
5.1.6	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami ir šiltinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: ant jau esamos stogo dangos įrengiama nauja stogo danga, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, papraptų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Stovai ~ 29 m., išvadai ~ 31,50 m., vamzdynai ~ 165 m. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.	$U \leq 0,15$ (W/m ² K)	682,00 m ²	51 470,54	75,47	
5.1.7	išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą					

	<p>Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata, paviršius padengtas stiklo audiniu ir apsauga nuo vėjo. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,18$ (W/m²K). Spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Keičiamos išorinės palangės. Balkono laikančių konstrukcijų ir saugos aptvarų keitimas. Balkonuose esančių išorės sienų šiltinimo tipą ir būdą numatyti techninio darbo projekto rengimo metu. Techniniame projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Į bendrą kainą įskaiciuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.</p>	$U < 0,18$ (W/m ² K)	1774,00 m ²	172 627,94	97,31
5.1.8	<p>cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą</p> <p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Techniniame projekte numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.</p> <p style="text-align: right;">Antžeminė dalis 67 m² Požeminė dalis 160 m²</p>	$U < 0,22$ (W/m ² K)	227,00 m ²	19 276,38	84,92
5.1.9	<p>nuogrindos sutvarkymas</p> <p>Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.</p>		133,04 m ²	5 095,43	38,30

	balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą				
5.1.10	Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius viršutiniuose aukštuose. Balkonai stiklinami per visą aukštį. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		204,49 m ²	25 841,40	126,37
5.1.11	bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus) Pakeisti rūsio ir laiptinės langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Laiptinės langai 3 vnt Rūsio langai 3 vnt	$U \leq 1,3$ (W/m ² K)	23,06 m ²	4 549,48	262,28
5.1.12	bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus) Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Durims montuojami durų pritraukikliai. Tambūro duris pakeisti į plastikines. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Įėjimo durys 2 vnt Rūsio durys 2 vnt Tambūro durys 2 vnt	$U \leq 1,4$ (W/m ² K)	24,56 m ²	6 684,62	272,18
5.1.13	įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Pandusas 2 vnt		5 m ²	574,95	114,99
5.1.14	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus. darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Butų langai 8,4 m ² Balkonų durys 3,22 m ²	$U \leq 1,3$ (W/m ² K)	11,62 m ²	1 831,55	157,62
5.1.15	rūsio perdangos šiltinimas				

	Rūsio perdanga šiltinama apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu rūšio lubas ir nudažoma.	U<0,36 (W/m2K)	459,5 m ²	8 721,31	18,98
5.1.16	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)				
	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos. Investicijos skaičiuojamos butų skaičiui 51 vnt		1 kompl.	12 031,03	12 031,03
Iš viso (Eur be PVM)				432 324,08	
PVM				90 788,06	
Iš viso (Eur su PVM)				523 112,14	
5.2	kitos priemonės				
5.2.1	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas				
	Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždarojami armatūra, nauji stovai ir atsakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas. Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 285 m Stovai 139 m		1 kompl.	10 707,45	10707,45
5.2.2	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas				
	Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Buitinių nuotekų stovai 236 m Buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai 248 m Išvadai 12 m		1 kompl.	8 501,44	8501,44
5.2.3	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas				
	Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastasis remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą. Laiptinių sienų plotas 221 m2 Lubų plotas 107 m2 Laiptų plotas 80 m2 Turėklų plotas 21 m2		2 laiptinės	3 455,50	3 455,50

	Iš viso (Eur be PVM)	22 664,39
	PVM	4 759,52
	Iš viso (Eur su PVM)	27 423,91
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	4,98

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Priemonių paketas A

5.1 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis	
			Esama padėtis	Planuojama
1	2	3	4	5
6.1	Pastato energinio naudingumo klasė	klasė	F	C
6.2	skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus	463637	172023
	Sąnaudos šildymui		181,8	71,65
	Sąnaudos karštam vandeniui ruošti		120,79	40,62
6.2.1	Išorės sienų šiltinimas iš išorės.	kWh/m ² /metus	67,27	9,34
6.2.2	Stogo šiltinimas.		25,4	3,21
6.2.3	Ilginiai šiluminiai tilteliai		19,62	9,89
6.2.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus		30,71	19,26
6.2.5	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas įskaitant susijusius apdailos darbus		1,09	0,89
6.3	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais		60,59
6.4	Išmetamo ŠESD (CO ²) kiekio sumažėjimas	tonų/metus		39,32
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*				
6.5	pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	-	-
6.6	skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	-	-

Priemonių paketas B

5.2 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis	
			Esama padėtis	Planuojama
1	2	3	4	5
6.1	Pastato energinio naudingumo klasė	klasė	F	B
6.2	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus	463637	163422
	Sąnaudos šildymui		181,80	68,07
	Sąnaudos karštam vandeniui ruošti		120,79	38,59
6.2.1	Išorės sienų šiltinimas iš išorės.	kWh/m ² /metus	67,27	8,87
6.2.2	Stogo šiltinimas.		25,40	3,05
6.2.3	Ilginiai šiluminiai tilteliai		19,62	9,40
6.2.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus		30,71	18,30
6.2.5	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas įskaitant susijusius apdailos darbus		1,09	0,85
6.3	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais		62,56
6.4	Išmetamo ŠESD (CO ²) kiekio sumažėjimas	tonų/metus		40,60
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*				
6.5	pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	-	-
6.6	skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	-	-

7. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Priemonių paketas A

7.1 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	463687,23	302,62
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	436263,32	284,72
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	32458,1	21,18
8.3	Statybos techninė priežiūra	9273,74	6,05
8.4	Projekto administravimas	6488,99	4,23
Galutinė suma:		511 908,06	334,08

Priemonių paketas B

7.2 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	550536,05	359,3
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	523112,14	341,41
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	38537,52	25,15
8.3	Statybos techninė priežiūra	11010,72	7,19
8.4	Projekto administravimas	6488,99	4,23
Galutinė suma:		606 573,28	395,87

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darbų kainos.
2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m² + PVM.


LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725

8. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Priemonių paketas A

8.1 lentelė


Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
9.1	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
9.1.1	pagal suvestinę kainą	metais	48,97	
9.1.2	atėmus valstybės paramą	metais	34,42	
9.2	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
9.2.1	pagal suminę kainą	metais	46,08	
9.2.2	atėmus valstybės paramą	metais	31,52	

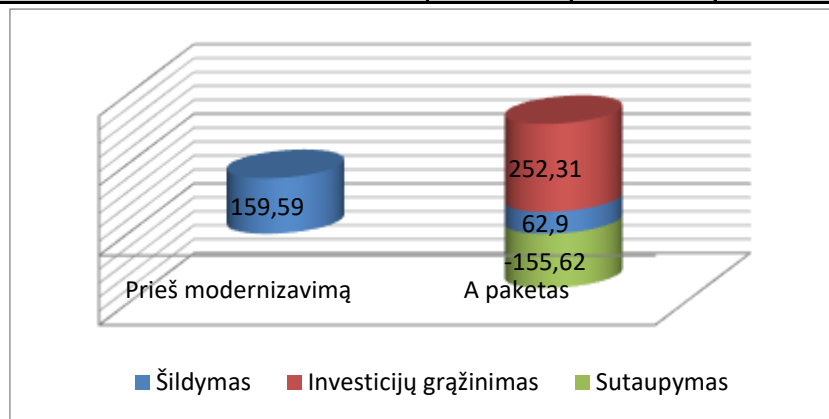

Priemonių paketas B

8.2 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
9.1	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
9.1.1	pagal suvestinę kainą	metais	56,31	
9.1.2	atėmus valstybės paramą	metais	39,55	
9.2	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
9.2.1	pagal suminę kainą	metais	53,51	
9.2.2	atėmus valstybės paramą	metais	36,75	

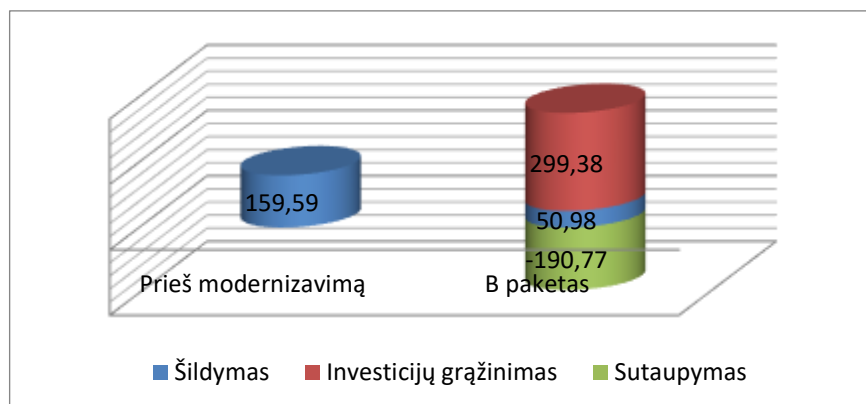

Pastabos:

Šildymo sąnaudos "prieš modernizavimą", t.y. faktinės šildymo sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams.

Investicijų grąžinimas = $I / 20 / S / K \times P_n$, kur:

I - investicijų suma, Eur;

20 - projekto įgyvendinimo laikotarpis, metais;

S - naudingasis pastato plotas, m²;

K - šildymo kaina, Eur/kWh;

P_n - palūkanų norma (anuiteto metodu).

9. Projekto finansavimo planas

Priemonių paketas A

9.1 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
11.1.2	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	463687,23	90,58	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	48220,83	9,42	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0	0	
	Iš viso:	511908,06	100	
11.2	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	32458,1	100	Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 mėn.
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	9273,74	100	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas *	6488,99	100	
11.2.4	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	130879	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	6915,38	10	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	1598,67	23,12	proc.
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius	5316,71	76,88	proc.

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Priemonių paketas B

9.2 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
11.1.2	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	550536,05	90,76	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	56037,23	9,24	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0	0	
	Iš viso:	606573,28	100	
11.2	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	38537,52	100	Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 mėn.
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	11010,72	100	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*	6488,99	100	
11.2.4	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	156933,64	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	6915,38	10	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	1598,67	23,12	proc.
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinčius ventilius	5316,71	76,88	proc.

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

10. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas A

10.1 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendras) plotas m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Butai									
12.1	2	56,28	15280,14	0,00	1007,30	16287,44	4826,25	11461,19	1,13	
12.2	3	64,96	17636,78	0,00	1162,66	18799,44	5570,60	13228,84	1,13	
12.3	4	30,48	8275,39	0,00	545,53	8820,92	2613,79	6207,13	1,13	
12.4	5	28,57	7756,82	0,00	511,35	8268,16	2450,00	5818,16	1,13	
12.5	7	51,89	14088,25	0,00	928,73	15016,98	4449,79	10567,19	1,13	
12.6	101	39,92	10838,37	0,00	714,49	11552,86	3423,31	8129,55	1,13	
12.7	106	52,35	14213,14	0,00	936,96	15150,10	4489,24	10660,86	1,13	
12.8	200	20,70	5620,10	631,52	370,49	6622,10	1974,58	4647,52	1,25	
12.9	201	24,16	6559,49	0,00	432,42	6991,91	2071,82	4920,09	1,13	
12.10	202	20,82	5652,68	0,00	372,64	6025,31	1785,41	4239,90	1,13	
12.11	203	22,93	6225,55	0,00	410,40	6635,95	1966,35	4669,60	1,13	
12.12	204	20,85	5660,82	0,00	373,17	6033,99	1787,98	4246,01	1,13	
12.13	205	22,90	6217,40	0,00	409,87	6627,27	1963,77	4663,50	1,13	
12.14	206	38,22	10376,81	1353,25	684,06	12414,13	3704,96	8709,17	1,26	
12.15	207	33,18	9008,44	2461,33	593,86	12063,63	3622,74	8440,89	1,41	
12.16	208	33,30	9041,02	1353,25	596,00	10990,28	3283,05	7707,23	1,28	
12.17	209	33,20	9013,87	1353,25	594,21	10961,34	3274,47	7686,87	1,28	
12.18	210	21,39	5807,43	0,00	382,84	6190,27	1834,29	4355,98	1,13	
12.19	211	20,50	5565,79	0,00	366,91	5932,70	1757,96	4174,74	1,13	
12.20	212	22,85	6203,82	0,00	408,97	6612,80	1959,49	4653,31	1,13	
12.21	213	20,51	5568,51	0,00	367,09	5935,60	1758,82	4176,78	1,13	
12.22	214	21,13	5736,84	631,52	378,19	6746,55	2011,46	4735,09	1,24	

12.23	216	22,16	6016,49	0,00	396,62	6413,11	1900,32	4512,79	1,13	
12.24	300	38,95	10575,01	631,52	697,13	11903,66	3539,60	8364,06	1,19	
12.25	302	23,46	6369,44	0,00	419,89	6789,33	2011,80	4777,53	1,13	
12.26	303	46,22	12548,83	0,00	827,25	13376,08	3963,57	9412,51	1,13	
12.27	304	24,85	6746,83	0,00	444,77	7191,60	2131,00	5060,60	1,13	
12.28	306	38,20	10371,38	1353,25	683,71	12408,34	3703,24	8705,10	1,26	
12.29	307	33,14	8997,58	0,00	593,14	9590,72	2841,90	6748,82	1,13	
12.30	308	33,30	9041,02	1353,25	596,00	10990,28	3283,05	7707,23	1,28	
12.31	309	33,25	9027,45	1353,25	595,11	10975,81	3278,76	7697,05	1,28	
12.32	310	23,89	6486,19	0,00	427,58	6913,77	2048,67	4865,10	1,13	
12.33	312	23,43	6361,30	0,00	419,35	6780,65	2009,22	4771,43	1,13	
12.34	313	39,40	10697,19	1300,95	705,18	12703,32	3789,63	8913,69	1,25	
12.35	314	20,16	5473,48	438,66	360,82	6272,97	1867,36	4405,61	1,21	
12.36	316	25,79	7002,04	0,00	461,59	7463,63	2211,60	5252,03	1,13	
12.37	400	21,82	5924,18	0,00	390,54	6314,71	1871,16	4443,55	1,13	
12.38	401	20,55	5579,37	0,00	367,80	5947,17	1762,25	4184,92	1,13	
12.39	403	22,55	6122,37	0,00	403,60	6525,97	1933,76	4592,21	1,13	
12.40	404	43,00	11674,59	631,52	769,62	13075,73	3886,90	9188,83	1,19	
12.41	405	24,01	6518,77	0,00	429,73	6948,50	2058,96	4889,54	1,13	
12.42	406	33,31	9043,74	1353,25	596,18	10993,17	3283,90	7709,27	1,28	
12.43	407	33,16	9003,01	1353,25	593,50	10949,76	3271,04	7678,72	1,28	
12.44	408	33,25	9027,45	0,00	595,11	9622,56	2851,33	6771,23	1,13	
12.45	409	38,32	10403,96	2706,51	685,85	13796,33	4140,96	9655,37	1,40	
12.46	410	22,43	6089,79	0,00	401,45	6491,25	1923,47	4567,78	1,13	
12.47	411	21,10	5728,70	0,00	377,65	6106,34	1809,42	4296,92	1,13	
12.48	412	22,92	6222,83	0,00	410,22	6633,05	1965,49	4667,56	1,13	
12.49	413	20,38	5533,21	0,00	364,76	5897,98	1747,67	4150,31	1,13	
12.50	414	24,04	6526,91	0,00	430,27	6957,18	2061,53	4895,65	1,13	
12.51	416	24,10	6543,20	0,00	431,34	6974,55	2066,68	4907,87	1,13	
		1532,23	416003,79	20259,53	27423,91	463687,23	137794,37	325892,86		

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžių stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas įvertinant 3 proc. metines palūkanas ir 240 mėn. kredito terminą.

Priemonių paketas B

10.2 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendrasis) plotas m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Butai									
12.1	2	56,28	16598,18	740,00	1007,30	18345,48	5430,66	12914,82	1,27	
12.2	3	64,96	19158,09	740,00	1162,66	21060,75	6232,47	14828,28	1,27	
12.3	4	30,48	8989,20	740,00	545,53	10274,74	3047,38	7227,36	1,32	
12.4	5	28,57	8425,90	740,00	511,35	9677,25	2870,94	6806,31	1,32	
12.5	7	51,89	15303,47	740,00	928,73	16972,20	5025,13	11947,07	1,28	
12.6	101	39,92	11773,26	740,00	714,49	13227,75	3919,40	9308,35	1,29	
12.7	106	52,35	15439,13	740,00	936,96	17116,10	5067,62	12048,48	1,28	
12.8	200	20,70	6104,87	1833,31	370,49	8308,67	2486,40	5822,27	1,56	
12.9	201	24,16	7125,30	740,00	432,42	8297,72	2463,57	5834,15	1,34	
12.10	202	20,82	6140,26	740,00	372,64	7252,90	2155,03	5097,87	1,36	
12.11	203	22,93	6762,55	740,00	410,40	7912,95	2349,95	5563,00	1,35	
12.12	204	20,85	6149,11	740,00	373,17	7262,28	2157,81	5104,47	1,36	
12.13	205	22,90	6753,70	740,00	409,87	7903,56	2347,17	5556,39	1,35	
12.14	206	38,22	11271,89	3085,64	684,06	15041,60	4497,06	10544,54	1,53	
12.15	207	33,18	9785,49	4193,72	593,86	14573,07	4378,56	10194,51	1,70	
12.16	208	33,30	9820,88	3085,64	596,00	13502,53	4042,58	9459,95	1,58	
12.17	209	33,20	9791,39	3085,64	594,21	13471,24	4033,34	9437,90	1,58	
12.18	210	21,39	6308,37	740,00	382,84	7431,21	2207,69	5223,52	1,35	
12.19	211	20,50	6045,89	740,00	366,91	7152,80	2125,47	5027,33	1,36	
12.20	212	22,85	6738,95	740,00	408,97	7887,92	2342,56	5545,36	1,35	
12.21	213	20,51	6048,84	740,00	367,09	7155,93	2126,40	5029,53	1,36	
12.22	214	21,13	6231,69	1833,31	378,19	8443,18	2526,12	5917,06	1,55	
12.23	216	22,16	6535,46	740,00	396,62	7672,08	2278,82	5393,26	1,35	
12.24	300	38,95	11487,19	1833,31	697,13	14017,63	4172,24	9845,39	1,40	

12.25	302	23,46	6918,86	740,00	419,89	8078,74	2398,90	5679,84	1,34	
12.26	303	46,22	13631,27	740,00	827,25	15198,51	4501,36	10697,15	1,28	
12.27	304	24,85	7328,80	740,00	444,77	8513,56	2527,31	5986,25	1,34	
12.28	306	38,20	11266,00	3085,64	683,71	15035,34	4495,22	10540,12	1,53	
12.29	307	33,14	9773,69	740,00	593,14	11106,84	3293,10	7813,74	1,31	
12.30	308	33,30	9820,88	3085,64	596,00	13502,53	4042,58	9459,95	1,58	
12.31	309	33,25	9806,14	3085,64	595,11	13486,89	4037,96	9448,93	1,58	
12.32	310	23,89	7045,67	740,00	427,58	8213,26	2438,63	5774,63	1,34	
12.33	312	23,43	6910,01	740,00	419,35	8069,36	2396,13	5673,23	1,34	
12.34	313	39,40	11619,90	2502,74	705,18	14827,82	4423,49	10404,33	1,46	
12.35	314	20,16	5945,61	1178,66	360,82	7485,10	2231,46	5253,64	1,45	
12.36	316	25,79	7606,02	740,00	461,59	8807,61	2614,14	6193,47	1,33	
12.37	400	21,82	6435,18	740,00	390,54	7565,72	2247,41	5318,31	1,35	
12.38	401	20,55	6060,63	740,00	367,80	7168,44	2130,09	5038,35	1,36	
12.39	403	22,55	6650,48	740,00	403,60	7794,08	2314,84	5479,24	1,35	
12.40	404	43,00	12681,62	1833,31	769,62	15284,54	4546,36	10738,18	1,38	
12.41	405	24,01	7081,06	740,00	429,73	8250,79	2449,71	5801,08	1,34	
12.42	406	33,31	9823,83	3085,64	596,18	13505,65	4043,50	9462,15	1,58	
12.43	407	33,16	9779,59	3085,64	593,50	13458,73	4029,64	9429,09	1,58	
12.44	408	33,25	9806,14	740,00	595,11	11141,25	3303,26	7837,99	1,31	
12.45	409	38,32	11301,39	5431,28	685,85	17418,52	5241,00	12177,52	1,76	
12.46	410	22,43	6615,09	740,00	401,45	7756,54	2303,76	5452,78	1,35	
12.47	411	21,10	6222,84	740,00	377,65	7340,49	2180,90	5159,59	1,36	
12.48	412	22,92	6759,60	740,00	410,22	7909,82	2349,02	5560,80	1,35	
12.49	413	20,38	6010,50	740,00	364,76	7115,26	2114,39	5000,87	1,36	
12.50	414	24,04	7089,91	740,00	430,27	8260,18	2452,48	5807,70	1,34	
12.51	416	24,10	7107,61	740,00	431,34	8278,95	2458,02	5820,93	1,34	
	Viso:	1532,23	451887,38	71224,76	27423,91	550536,05	163849,03	386687,02		

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas įvertinant 3 proc. metines palūkanas ir 240 mėn. kredito terminą.

11. Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis:

Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui Eur/m²/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

apskaičiuojama pagal formulę:

$I = ((E_e - E_p) \times K_e / 12) \times K \times K_p \times K_a$, kur:

I – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos didžiausias dydis (Eur/m²/mėn.);

E_e – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m²/metus);

E_p – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m²/metus);

K_e – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Eur/kWh);

12 – mėnesių skaičius metuose (mėn.);

K_p – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos įvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9.

K_a – koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) – 1.3.

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis - 1,2

A paketas	13.1 Neįvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai	1,17	Eur/m ² /mėn.
	13.2 Įvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai	1,29	

B paketas	13.1 Neįvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai	1,21	Eur/m ² /mėn.
	13.2 Įvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai	1,33	

PASTABA:

Skaičiavimuose naudojama šilumos kaina - 0,0561 Eur/kWh

12. Preliminarus kredito gražinimo terminas : 240 mėnesiais (20.0 metų);

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) (CO₂ ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas šiluminės energijos sutaupymo atveju

Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas)	MWh/metus	(A)	110,15
Taršos faktoriaus reikšmė	t CO ₂ ekv./MWh	(B) ¹	0,233
Metinis ŠESD kiekio sumažinimas	t CO ₂ ekv./metus	(C) = (A) x (B)	39,32
Projekto vertinamasis laikotarpis	metais	(D) ²	25
Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas	t CO ₂ ekv.	(E) = (C) x (D)	983

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO₂ ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas elektros energijos sutaupymo atveju

Metinis elektros energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas)	MWh/metus	(A)	8,24
Taršos faktoriaus reikšmė	t CO ₂ ekv./MWh	(B) ¹	0,707
Metinis ŠESD kiekio sumažinimas	t CO ₂ ekv./metus	(C) = (A) x (B)	5,83
Projekto vertinamasis laikotarpis	metais	(D) ²	25
Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas	t CO ₂ ekv.	(E) = (C) x (D)	145,75

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-03537

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-6001-0012

Pastato adresas: Sodų g. 4, Palanga, Palangos m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1646,88

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1646,88

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	196,51
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	205,25
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	1,41
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	181,80
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	1,64
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	120,79
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	28,86
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	11,78
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	42,38

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2019-12-18 Sertifikato galiojimo terminas: 2029-12-18

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Kęstutis Keliuotis

Atestato
Nr.0212

199098

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-03537

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-6001-0012

Pastato adresas: Sodų g. 4, Palanga, Palangos m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1646,88

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1646,88

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

F

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² metai):	208,06
Atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² metai):	283,81
Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² metai):	196,51
Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² metai):	205,25
Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	1,41

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti:

	Norminės	Atskaitinės	Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² metai):	80,57	106,58	78,18
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² metai):	-	-	119,99
Šiluminės energijos, kWh/(m ² metai):	61,98	81,36	181,80

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsininti:

	Norminės	Atskaitinės	Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² metai):	0	0	1,35
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² metai):	-	-	0,47
Šiluminės energijos, kWh/(m ² metai):	0	0	1,64

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti:

	Norminės	Atskaitinės	Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² metai):	58,49	108,23	51,94
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² metai):	-	-	79,72
Šiluminės energijos, kWh/(m ² metai):	45,00	70,28	120,79

Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje):

	Norminės	Atskaitinės	Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m ² metai):	69,00	69,00	66,39
Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m ² metai):	-	-	5,54
Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m ² metai):	30,00	30,00	28,86
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² metai):	13,50	13,50	11,78

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltiniai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai:	Šildomi plotai, m ² :
Šil. šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas	1646,88

Pastatui (jo daliai) vėsininti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas:	Šildomi plotai, m ² :

Pastatui (jo daliai) vėdininti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas:	Šildomi plotai, m ² :

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas:	Šildomi plotai, m ² :
Šil. šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas	1646,88

Pastato į aplinką išmetamas CO₂ kiekis (kgCO₂/(m² metai):

42,38

Pastato (jo dalies) sandarumo skaičiavimo duomenys, kartai per valandą:

2,59

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:

www.betalt.it
www.abnaujimbusta.it
www.ena.it

Sertifikato išdavimo data:

2019-12-18

Sertifikato galiojimo terminas:

2029-12-18

Sertifikatą išdavė
ekspertas



Kęstutis Keliuotis

Atestato
Nr. 0212

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-03537

Eil. Nr.	Energijos sąnaudų apibūdinimas	Skaičiuojamosios energijos sąnaudos kvadratiniam metre pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m ² ·metai)
1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas*	67,27
2.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą*	25,40
3.	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore*	0,00
4.	Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:	
4.1	- per grindis ant grunto*	0,00
4.2	- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*	0,00
4.3	- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*	0,00
4.4	- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*	0,00
4.5	- per šildomo rūšio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*	0,00
4.6	- per grindis virš vėdinamų pogrindžių*	0,00
4.7	- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūšių*	15,21
5.	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras*	30,71
6.	Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo*	1,09
7.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius*	19,62
8.	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo*	22,49
9.	Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos*	0,00
10.	Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	40,54
11.	Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	74,12
12.	Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai	79,10
13.	Suminės elektros energijos sąnaudos pastate	28,86
14.	Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui	11,78
15.	Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	120,79
16.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti	181,80
17.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti	1,64

* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas



Kęstutis Keliuotis

Atestato
Nr.0212

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-03537

Eil. Nr.	Priemonės pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti	Šiluminės energijos kiekis, kurį galima sutaupyti pastato (jo dalies) šildomo ploto kvadratiniam metre per metus, įdiegus priemonę, kWh/(m ² ·metai)	Šiluminės energijos dalis nuo dabartiniu metu pastato (jo dalies) suvartojamo energijos kiekio, kurią galima sutaupyti įdiegus priemonę
1.	Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	59,30	0,33
2.	Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	21,81	0,12
3.	Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0,00	0,00
4.	Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0,00	0,00
5.	Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0,00	0,00
6.	Vertikalieji pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0,00	0,00
7.	Vertikalieji ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0,00	0,00
8.	Šildomo rūšio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0,00	0,00
9.	Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0,00	0,00
10.	Grindų virš nešildomų vėdinamų rūšių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	10,36	0,06
11.	Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C klasės pastatui	13,14	0,07
12.	Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis reikalavimus C klasės pastatui	0,50	0,00
13.	Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	75,80	0,42
14.	Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui	21,82	0,12
15.	Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę ir jo šildymo sistema atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	119,83	0,66

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas



Kęstutis Keliuotis

Atestato Nr.0212







Literatūra:

1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);
2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);
3. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);
4. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);
5. STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”;
6. STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;
7. STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga” ;
8. STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.
9. STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;
10. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;
11. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”;
12. STR 2.01.03:2003 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės”;
13. STR 2.01.04: 2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;
14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;
15. RSN 27-01 “Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas”;
16. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.
17. PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ REKOMENDACIJOS XI, pagal 2019 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas. Vilnius, 2019, UAB „SISTELA“.
18. STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
19. SUSTAMBINTI STATYBOS DARBŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMAI. XXXIV. Pagal 2019 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas. Vilnius, 2019, UAB „Sistela“.
20. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.
21. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.
22. STATYBOS RESURSŲ SKAIČIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS, pagal 2019 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas. Vilnius, 2019, UAB „Sistela" ir įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO LT svetainėje.
23. DARBO, MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ ŠAŅAUDŲ STATYBOJE NORMATYVAI, RINKINYS R63P Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, (Pastatų inžinerinės sistemos). Vilnius, 2016, UAB „Sistela"
24. DARBO, MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ ŠAŅAUDŲ STATYBOJE NORMATYVAI, RINKINYS R62P Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilnius, 2016, UAB „Sistela"

BUTAS	Plotas	Keičiami langai					Balkonų stiklinimas iki pusės	Viso
		Virtuvė	Balkono langas	Balkono durys	m2	suma Eur su PVM		
2	56,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	30,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	51,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
101	39,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	52,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20,7	0	0	0	0,00	0,00	631,52	631,52
201	24,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
202	20,82	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
203	22,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
204	20,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
205	22,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
206	38,22	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
207	33,18	1	1	1	5,81	1108,08	1353,25	2461,33
208	33,3	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
209	33,2	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
210	21,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211	20,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	22,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213	20,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	21,13	0	0	0	0,00	0,00	631,52	631,52
216	22,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
300	38,95	0	0	0	0,00	0,00	631,52	631,52
302	23,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
303	46,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
304	24,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
306	38,2	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
307	33,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
308	33,3	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
309	33,25	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
310	23,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312	23,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
313	39,4	0	1	1	3,51	669,43	631,52	1300,95
314	20,16	1	0	0	2,30	438,66	0,00	438,66
316	25,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
400	21,82	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
401	20,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
403	22,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
404	43	0	0	0	0,00	0,00	631,52	631,52
405	24,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
406	33,31	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
407	33,16	0	0	0	0,00	0,00	1353,25	1353,25
408	33,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
409	38,32	0	0	0	0,00	0,00	2706,51	2706,51

410	22,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
411	21,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
412	22,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
413	20,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
414	24,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
416	24,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532,23	2	2	2	11,62	2216,17	18043,36	20259,53

BUTAS	Plotas	Keičiami langai					Balkonų stiklinimas per visą aukštį	Minirekuperatoriai	Viso
		Virtuvė	Balkono langas	Balkono durys	m2	suma Eur su PVM			
2	56,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
3	64,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
4	30,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
5	28,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
7	51,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
101	39,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
106	52,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
200	20,7	0	0	0	0,00	0,00	1093,31	740,00	1833,31
201	24,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
202	20,82	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
203	22,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
204	20,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
205	22,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
206	38,22	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
207	33,18	1	1	1	5,81	1108,08	2345,64	740,00	4193,72
208	33,3	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
209	33,2	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
210	21,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
211	20,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
212	22,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
213	20,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
214	21,13	0	0	0	0,00	0,00	1093,31	740,00	1833,31
216	22,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
300	38,95	0	0	0	0,00	0,00	1093,31	740,00	1833,31
302	23,46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
303	46,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
304	24,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
306	38,2	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
307	33,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
308	33,3	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
309	33,25	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
310	23,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
312	23,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
313	39,4	0	1	1	3,51	669,43	1093,31	740,00	2502,74
314	20,16	1	0	0	2,30	438,66	0,00	740,00	1178,66
316	25,79	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
400	21,82	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
401	20,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
403	22,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
404	43	0	0	0	0,00	0,00	1093,31	740,00	1833,31
405	24,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
406	33,31	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
407	33,16	0	0	0	0,00	0,00	2345,64	740,00	3085,64
408	33,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
409	38,32	0	0	0	0,00	0,00	4691,28	740,00	5431,28

410	22,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
411	21,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
412	22,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
413	20,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
414	24,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
416	24,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
	1532,23	2	2	2	11,62	2216,17	31268,59	37740	71224,76
